令和5年度

資 料 2

川口地区公共下水道整備事業について

1. 現状と課題

川口地区公共下水道整備事業については、平成29年度から着手し、令和7年度完成を目途に事業を進めています。

今後も引き続き、関係機関との調整、及び地域住民に対し下水道整備の啓蒙を図っていきながら事業を進めていく予定です。

川口地区	計画面積	令和4年度末整備済面積	令和4年度末の整備率
	50.8 ha	17. 9ha	35.2%

2. 令和4年度の取組状況

（1）幹線管渠工事及び枝線管渠工事を実施　管延長＝3.55km

（2）川口地区公共下水道事業の周知

地元自治会と調整しながら、また新型コロナウィルス感染拡大防止に配慮しながら、パンフレット配布等を行い、川口地区住民への事業周知を行いました。（R4. 7）

3. 令和5年度の取組予定

（1）下水道管渠工事　管延長＝4.11km

（2）川口地区公共下水道事業の周知

・地元自治会と調整しながらパンフレットを配布し下水道事業について啓蒙活動を実施

・工事沿線の自治会と調整しながら、工事に関係する沿線住民に対して工事説明会を実施
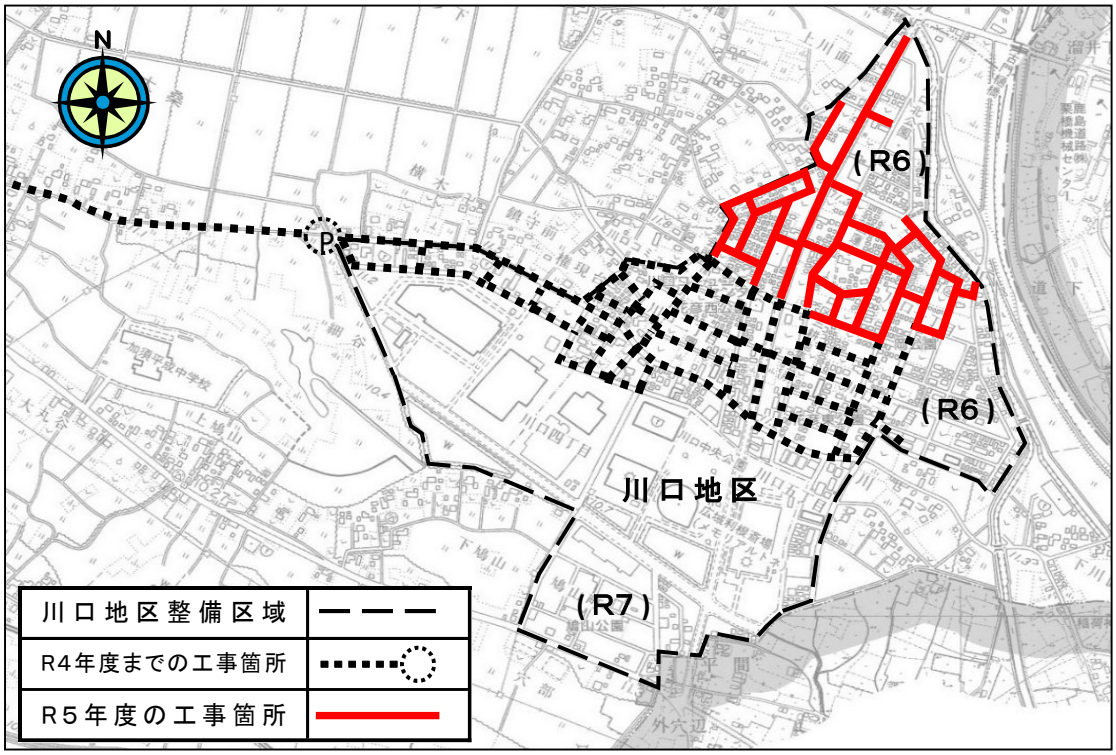
4. 施工区域図
